後付エレベーター昇降路

全市域エリア高等特別支援学校校舎内部改造工事

施主名：福岡市
施工地：福岡市南区清水
施工時期：令和4年12月

後付エレベーターで施設のバリアフリー化にお応えします。

旧住吉中学校をリニューアルし、特別支援学校高等部を新設する工事で、バリアフリー化に後付エレベーターを採用していただきました。令和五年四月より「清水高等学園」として開校されています。

後付エレベーター昇降路のメリット

① 短工期での設置

プレキャスト製品の組立工事は五日間で完成。大型重機の乗り入れはわずか一日だけ。

② 耐震設計構造により地震時も完全自立・単独安定

③ 工場製品としての品質の安定

工場で徹底管理され製造された安定した高品質な製品。

④ 施工安全性が高く施工環境にも優れた工法

内部足場のみで施工可能。また、工場塗装品で、施工環境への配慮が軽減。

工　程

1
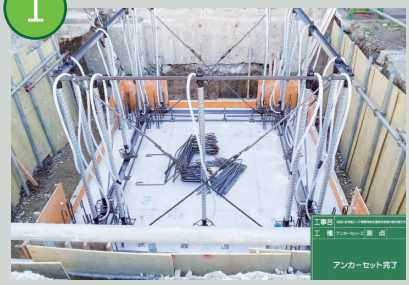

アンカーセット

2

基礎工

3

架設工.1

4

架設工.2

5

PC緊張工

6

PC工事完了

現場担当者から一言　福岡営業所

現場入り口の交通量が多い為、
早朝からの製品搬入になり、元請様と
トラックドライバーさんには寒い中協力して
いただきました。また、製品誤差が少なく
元請様から喜ばれました。

問い合わせ先

株式会社ヤマウ

福岡市早良区東入部5-15-7
TEL 092-872-3331
FAX 092-872-3332
https://www.yamau.co.jp/
